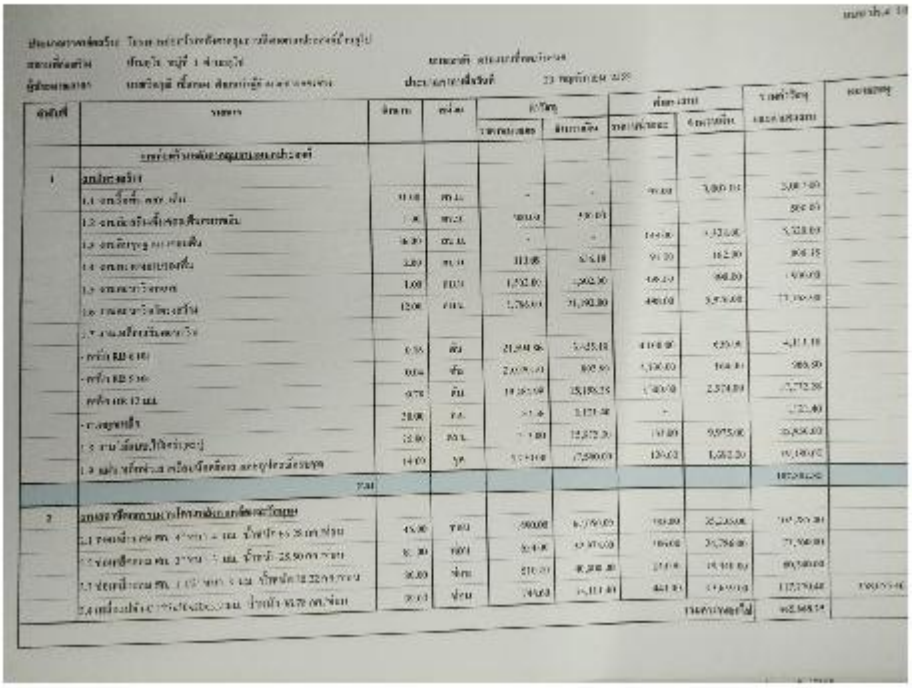

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1 **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านยุโปพร้อมต่อเติมหลังคาอาคารผู้สูงอายุ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลยุโป

2 **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**
1,990,000.-บาท (เงินหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

3 **ลักษณะงานโดยสังเขป**
ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์และต่อเติมหลังคาอาคารผู้สูงอายุ

4 **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 23 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 2,078,000.-บาท
(เงินสองล้านเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

5 **บัญชีประมาณราคากลาง**
5.1 แบบสรุปราคากลาง ปร.6
5.2 แบบ ปร.5
5.3 แบบ ปร.4

6 **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
1. นายรานินทร์ บือราแง นายกเทศมนตรีตำบลยุโป ประธานกรรมการ
2. นางสาวนวรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง ปลัดเทศบาล กรรมการ
3. นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา
สำนักงานเทศบาลตำบลยุโป บ้านยุโป หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 560/2559 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ เดือน 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 11.30 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 560/2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์และส่งเสริมหลักประชาคารผู้สูงอายุตำบลยุโป บ้านยุโป หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้ร่วมประชุมในการกำหนดราคากลางแล้ว

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

<u>คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแล้วตามรายละเอียดดังนี้</u>

1. มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า "ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

2. ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และตารางอัตราราคางานดิน ให้สอดคล้องตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อีก 2 รายการ ประกอบด้วย ตารางอัตรางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ตารางราคางานปลูกหญ้า ไม่ปรับปรุงใหม่ยังคงใช้ตามแนวทางเดิม สำหรับข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555

3. มติ ครม.เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 สรุปว่า โครงการก่อสร้างใหม่ พิจารณาเพิ่มระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ประมาณการไว้เดิม ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคางานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ

/4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง

4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว354 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F และประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสรุปให้ใช้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

5.ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือนตุลาคม 2559 (ราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ยังไม่ประกาศใช้)ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการประเมินแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2556 รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติครม. เมื่อ 13 มีนาคม 2555 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพจ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

<u>**มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้**</u>

1.คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว มีมติกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง **เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น <u>2,078,000</u> บาท(เงินสองล้านเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)** กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 120 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ 50 ตามมติ ครม. อีก 60 วัน รวม 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว

จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..............................ประธานกรรมการ
(นายธานินทร์ [illegible])
นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..............................กรรมการ
(นางสาวนวรัตน์ เพชรเรืองทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..............................กรรมการ
(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)
ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

/ความเห็นปลัด

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลธุโป

-เพื่อโปรดพิจารณา [illegible]

(ลงชื่อ) 23/11/59

(นางสาวนวรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลธุโป

วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลธุโป

(/) อนุมัติ

( ) ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ)

(นายธานินทร์ ปิ่งราม)

นายกเทศมนตรีตำบลธุโป

วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป โทร/โทรสาร 073-270064

ที่ ยล 53303/ - **วันที่** 23 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านยุโป หมู่ที่ 1

เรียน **นายกเทศมนตรีตำบลยุโป** (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลยุโป)

อ้างถึง บันทึกข้อความกองการศึกษา ที่ ยล 53304/- ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เรื่องขออนุมัติจัดจ้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านยุโป หมู่ที่ 1

เรื่องเดิม

1.ตามที่เทศบาลตำบลยุโป ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และตามรายจ่ายในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านยุโป หมู่ที่ 1 งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,990,000 บาท (เงินหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโปที่ 560/2559 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้ลงนามท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 1)

__ข้อเท็จจริง__

ตามเรื่องเดิม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์และต่อเติมหลังคาอาคารผู้สูงอายุตำบลยุโป บ้านยุโป หมู่ที่ 1

โดยได้ทำการประชุมพิจารณาโครงการเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโปรายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประชุม (เอกสารหมายเลข 2)

/ข้อกฎหมาย

ข้อกฎหมาย

1.มติครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารแนบหมายเลข 3)

2.ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และตารางอัตราราคางานดิน ให้สอดคล้องตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อีก 2 รายการ ประกอบด้วย ตารางอัตรางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ตารางราคางานปลูกหญ้า ไม่ปรับปรุงใหม่ยังคงใช้ตามแนวทางเดิม สำหรับข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 4)

3.มติ ครม.เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 สรุปว่า โครงการก่อสร้างใหม่ พิจารณาเพิ่มระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ประมาณการไว้เดิม , ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคางานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ (เอกสารหมายเลข 5)

4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F และประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสรุปว่าให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 6 ต่อปี ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559(เอกสารหมายเลข 6)

<u>**ข้อพิจารณา**</u>

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว **เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น <u>2,078,000</u> บาท(เงินสองล้านเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)** กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 120 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ 50 ตามมติ ครม. อีก 60 วัน รวม 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว (เอกสารหมายเลข7)

/ข้อเสนอ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..................................ประธานกรรมการ

(นายธานินทร์ ปีอราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

(นางสาวนวรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

(นายเชิดรุสมิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

[illegible]

....

(ลงชื่อ) 25/11/59

(นางสาวนวรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(✓) อนุมัติ

( ) ไม่อนุมัติ เพราะ..

....

....

(ลงชื่อ)

(นายธานินทร์ ปีอราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านยุโปพร้อมต่อเติมหลังคาอาคารผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านยุโป หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลยุโป

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน ค่างานก่อสร้างงานอาคาร	1,976,248.65	
2	กลุ่มงาน/งาน ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
3	กลุ่มงาน/งาน ป้ายประจำโครงการ		
4	กลุ่มงาน/งาน..........		
	..........รวม..........		
5	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5 %	98,812.43	
	ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558		
6	อื่นๆ	3,000.00	(ป้ายโครงการ)
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	2,078,166.08	
	ราคากลาง	2,078,000.00	
	ตัวอักษร(-สองล้านเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.................................ประธานกรรมการ

(นายธานินทร์ บือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ลงชื่อ.................................กรรมการ

(นางสาวมรรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ลงชื่อ.................................กรรมการ

(นายเพิ่มวุฒิ เรื่องทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

โครงการ โครงการก่อสร้าง[illegible]บ้านยุโป

ปริมาณงาน ตามบัญชีแนบท้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านยุโป หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ประมาณราคาโดย นาย[illegible] เชื้อทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ [illegible] พฤศจิกายน 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประมาณการงานก่อสร้างอาคาร	1,515,372.37	1.3047	1,976,348.65	Factor F งานอาคาร
2	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5 % (มติ ครม.)	1,976,348.65	0.05	98,817.43	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประมาณการไม่ต้องปรับราคา (ป้ายโครงการ)	-	-	3,000.00	เงินประกันผลงาน 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	สรุปรวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน			2,078,166.08	
	ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินตั้งงบประมาณค่าก่อสร้าง			2,078,000.00	
	สองล้านเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน				

หมายเหตุ ราคาวัสดุก่อสร้าง[illegible] สำนักงานพาณิชย์จังหวัด[illegible] ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
[illegible] เดือนพฤศจิกายน 2559 [illegible]

ลงชื่อ........................ผู้ประมาณราคา
(นาย[illegible] เชื้อทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ........................เห็นชอบ
(นางสาว[illegible])
ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ลงชื่อ........................อนุมัติ
(นาย[illegible])
นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	[illegible]								
1	[illegible]								
	1.1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	3,000.00	3,000.00	
	1.2 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			500.00	
	1.3 [illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	5,328.00	
	1.4 [illegible]	2.00	[illegible]	313.08	[illegible]	91.00	162.00	808.15	
	1.5 [illegible]	1.00	[illegible]	1,502.00	1,502.00	[illegible]	400.00	[illegible]	
	1.6 [illegible]	12.00	[illegible]	1,766.00	21,192.00	440.00	[illegible]	[illegible]	
	1.7 [illegible]								
	- [illegible]	0.36	[illegible]	21,944.96	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	- [illegible]	0.04	[illegible]	[illegible]	805.50	4,100.00	164.00	969.50	
	- [illegible]	0.78	[illegible]	[illegible]	15,198.25	[illegible]	2,574.00	17,772.25	
	- [illegible]	28.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-		[illegible]	
	1.8 [illegible]	15.00	[illegible]	[illegible]	15,872.20	[illegible]	9,975.00	25,850.00	
	1.9 [illegible]	14.00	[illegible]	[illegible]	17,500.00	120.00	1,680.00	19,180.00	
	รวม							[illegible]	
2	[illegible]								
	2.1 [illegible]	45.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	2.2 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	71,500.00	
	2.3 [illegible]	30.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	80,580.00	
	2.4 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	117,770.40	[illegible]
							รวมค่าก่อสร้าง	[illegible]	

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	[illegible]							514,521.84	
	1.4 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	1.5 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	250.00	375.00	[illegible]	
	1.6 [illegible]	[illegible]	[illegible]	266.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	1.7 [illegible]								
	-เหล็ก RB 6 มม.	3.18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	-เหล็ก RB 9 มม.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	-เหล็ก DB 12 มม.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11,276.34	3,200.00	2,574.00	[illegible]	
	-[illegible]	39.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]			1,364.02	
	1.8 [illegible]	45.00	[illegible]	212.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	88,757.33
								78,187.82	
2	[illegible]								
	2.1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	2.2 [illegible]	[illegible]	[illegible]	510.72	[illegible]	202.00	[illegible]	3,424.36	
	2.3 [illegible]	5.00	[illegible]	[illegible]	2,801.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	2.4 [illegible]	20.00	[illegible]	[illegible]	4,872.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	2.5 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	2.6 [illegible]	[illegible]	[illegible]	1,000.00	[illegible]	100.00	[illegible]	[illegible]	
	2.7 [illegible]	250.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	13,972.50	
	2.8 [illegible]	[illegible]	[illegible]		-	45.00	[illegible]	[illegible]	
	2.9 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-		[illegible]	[illegible]
							[illegible]	[illegible]	

ประเภทงานก่อสร้าง [illegible]
สถานที่ก่อสร้าง [illegible]
ผู้ยื่นเสนอราคา [illegible]

[illegible]

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							[illegible]	
	2.10 [illegible]	12.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	1,344.00	
	2.11 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	
	2.12 [illegible]	15.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]
	2.13 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-		[illegible]	[illegible]
	2.14 [illegible]	90.00	[illegible]	42.00	[illegible]	100.00	[illegible]	[illegible]	
	2.15 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17,534.00
	รวม							18,738.50	
3	[illegible]								
	3.1 [illegible]								
	- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,800.00	[illegible]	
	- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	3.2 [illegible]								
	[illegible]	1.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
							ยอดยกไป	[illegible]	

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	[illegible]							1,131,636.27	
	[illegible]								
	- [illegible] W	2.00	ชุด	145.00	290.00	125.00	250.00	[illegible]	
	- [illegible] 400 W	8.00	ชุด	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9,000.00	[illegible]	
	- [illegible]	10.00	ตัว	20.00	[illegible]	50.00	500.00	[illegible]	
	- [illegible]	[illegible]	ตัว	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,426.00	
	[illegible]	1.00	ตัว	20.00	20.00		-	20.00	
	[illegible]	5.00	ตัว	20.00	100.00	-	-	100.00	
	- [illegible]	[illegible]	ตัว	[illegible]	[illegible]		-	60.00	
	- [illegible]	[illegible]	ตัว	21.00	189.00			189.00	
	- [illegible]	7.00	ตัว	35.00	245.00		-	245.00	
	- [illegible]	100.00	เส้น	31.00	3,100.00			3,100.00	
	[illegible]	[illegible]	ตัว	[illegible]	510.00			[illegible]	
	[illegible]	100.00	ตัว	2.20	200.00			[illegible]	
	- [illegible]	[illegible]	ตัว	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	
	- [illegible]	100.00	ตัว	[illegible]	[illegible]	-		600.00	
	- [illegible]	12.00	ชุด	350.00	4,200.00	[illegible]	[illegible]	5,064.00	
	- [illegible]	1.00	[illegible]	-	-		-	[illegible]	[illegible]
	รวม							443,305.00	
					256,251.00				
							รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	1,585,???	

[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	[illegible]								
1	[illegible]								
	[illegible]							[illegible]	
	[illegible]							[illegible]	
2	[illegible]								
	[illegible]							[illegible]	
	[illegible]							[illegible]	
[illegible]	[illegible]							[illegible]	
	[illegible]							[illegible]	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	[illegible]							[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	75.00	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]								
	[illegible]	35.00	[illegible]	215.00	[illegible]	[illegible]	1,520.00	[illegible]	
	[illegible]	30.00	[illegible]	[illegible]	5,280.00	[illegible]	2,000.00	[illegible]	
	2.8 [illegible]	[illegible]	[illegible]	190.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	2.9 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	2.10 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	2.11 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	500.00	2,000.00	[illegible]	
	2.12 [illegible]	52.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
	2.13 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]
	2.14 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14,400.00	[illegible]	
	2.15 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	2.16 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]								[illegible]
	[illegible]							[illegible]	
1	[illegible]								
	1.1 [illegible]	[illegible]	[illegible]		-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	1.2 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		-	[illegible]	
	1.3 [illegible]	[illegible]	[illegible]	-		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							[illegible]	[illegible]	

สำเนาคู่ฉบับ

คำสั่งเทศบาลตำบลยุโป

ที่ 569/2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลยุโป ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จะดำเนินการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1.โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านยุโป หมู่ที่ 1 เงินงบประมาณ 1,990,000 บาท (เงินหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

2.โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง เงินงบประมาณ 251,000.- บาท (เงินสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 เทศบาลตำบลยุโป จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

1.นายธานินทร์ บือราแง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลยุโป ประธานกรรมการ
2.นางสาวนวรัตน์ เพียรเจริญทอง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลยุโป กรรมการ
3. นายเจิดวุฒิ เชื้อทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(นายธานินทร์ บือราแง)
นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

พิมพ์..........
ตรวจ..........
ทาน..........
